


Gantt kort for Helena's portfolio

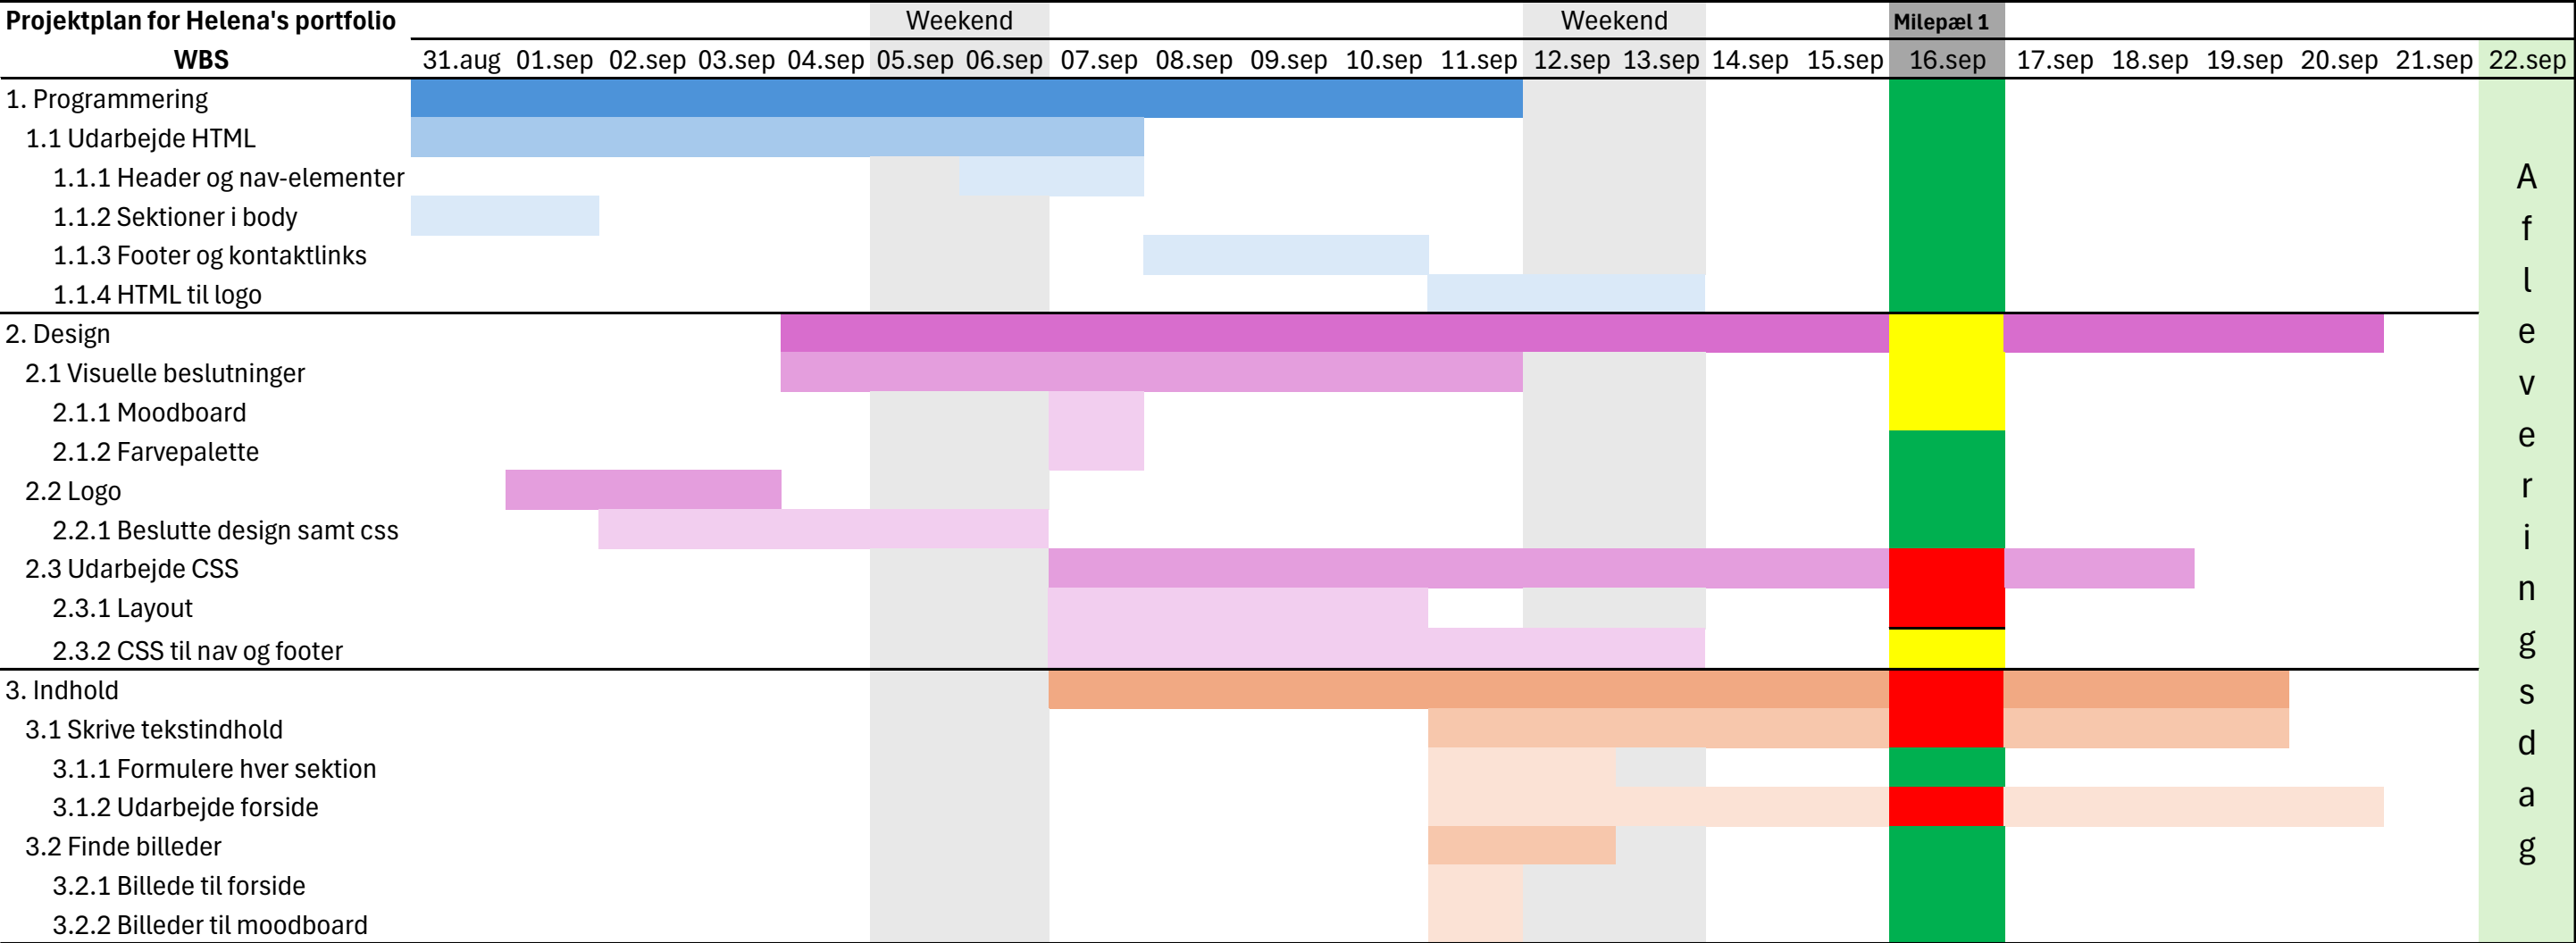

Work Breakdown Structure			
WBS	Opgave	Estimering	Reestimering
1	Programmering		
1.1	Udarbejde HTML	XL	XL
1.1.1	Header og nav-elementer	L	XL
1.1.2	Sektioner i body	L	L
1.1.3	Footer og kontaklinks	M	XL
1.1.4	HTML til logo	M	S
2	Design		
2.1	Visuelle beslutninger	M	S
2.1.1	Moodboard	S	S
2.1.2	Farvepalette	S	S
2.2	Logo		
2.2.1	Beslutte design samt skrive det ind i CSS	L	S
2.3	Udarbejde CSS	L	XL
2.3.1	Layout	L	L
2.3.2	CSS til nav og footer	M	XL
3	Indhold		
3.1	Skrive tekstindhold	XL	XL
3.1.1	Formulerer hver sektion	XL	L
3.1.2	Udarbejde forside	XL	XL
3.2	Finde billeder	S	S
3.2.1	Billede til forside	M	S
3.2.2	Billeder til moodboard	S	S

S	M	L	XL
2 timer	4 timer	6 timer	8+ timer

Logbog for Helena's Portfolio

Dato	Aktivitet/handling	I gang/færdig	Forhindringer/problemer	Løsninger
31.aug	Påbegyndelse af programmering	I gang	Skrive tags ind korrekt	Kigge i Benjamins notater på Gitbooken
01.sep	Header, nav-elementer og body	I gang	Skrive tags ind korrekt	
02.sep	Header, nav-elementer og body	I gang	Udarbejde ens struktur	
03.sep	Header, nav-elementer	I gang		
04.sep	Header, nav-elementer	I gang		
05.sep	Header, nav-elementer	I gang		
06.sep	Header, nav-elementer, logo	Færdig		
07.sep	Moodboard og farvepalette	Færdig	Finde den rigtige kombination	Brugte en hjemmeside, hvor man kan lave en farvepalette
08.sep	Footer, layout, og CSS	I gang	Lære de forskellige css kommandoer	Kigge Benjamins css videoer
09.sep	Beslutte design (layout) og CSS	I gang	Lære de forskellige css kommandoer	Kigge Benjamins css videoer
10.sep	CSS til nav og folder	I gang	Lære de forskellige css kommandoer	Kigge Benjamins css videoer
11.sep	CSS til nav og folder	I gang		
12.sep	CSS til nav og folder	I gang		
13.sep	CSS til nav og folder	I gang		
14.sep	CSS til nav og folder + formulere hver sektion	I gang		
15.sep	CSS til nav og folder	Færdig	Var meget sværere end jeg troede	
16.sep	Formulere indhold hver sektion	I gang	Gennemskue, hvad der er relevant	
17.sep	Finde billeder	Færdig		
18.sep	Færdiggøre det sidste med generel layout	I gang		
19.sep	Færdiggøre det sidste med generel layout	Færdig		
20.sep	Fridag			
21.sep	Skrive projektstyringsrefleksion	Færdig	Bruge de rigtige begreber	Kigge på Kirstens powerpoint
22.sep	AFLEVERINGSDAG			

Projektplan for min portfolio

Scope

Mit mål med projektet er at lave en personlig portfolio-hjemmeside i HTML og CSS, hvor man kan læse om mig, min uddannelse, arbejds erfaring og se mine kontaktoplysninger. Jeg vil gerne lave en forside med navigation og eventuelt flere HTML-sider, så de forskellige punkter i navigationen får deres egen side.

Jeg vil arbejde med et gennemgående design med farver, typografi, billeder, ikoner og et logo. Hjemmesiden vil jeg også gøre responsiv, så den fungerer på både computer og mobil.

MoSCoW

Must have	HTML-krav, standardkrav af css og nødvendigt indhold
Should have	CSS, hvor jeg laver det æstetiske design
Could have	Separate HTML-sider for hver af min nav-elementer
Will not have	JavaScript, da det er udenfor min scope at have sat tid af til det

Refleksion

Overordnet synes jeg, at projektet er gået godt, og jeg har fået lavet en portfolio, som jeg er okay tilfreds med. Jeg fik lavet de vigtigste dele, som jeg havde planlagt, blandt andet en forside, navigation, sektioner om mig, uddannelse og erhvervs erfaring samt en footer med kontaktoplysninger. Jeg synes også, at det visuelle udtryk blev nogenlunde, som jeg havde forestillet mig især i forhold til farvepalette, typografi, billeder, ikoner og logo.

Der var dog nogle ting, som ikke gik helt efter planen. Jeg havde blandt andet en idé om at lave flere forskellige HTML-sider, så man gennem navigationen kunne komme ind på separate sider. Det nåede jeg ikke, fordi CSS og især responsivt design, så hjemmesiden også fungerede på mobil, tog længere tid end forventet. Jeg valgte derfor i stedet at samle indholdet på én side og bruge navigationen til at scrolle ned til de forskellige sektioner.

Jeg undervurderede også, hvor meget tid der skulle bruges på at få hjemmesiden til at fungere på forskellige skærmstørrelser og browsere. Flere gange så hjemmesiden forskellig ud i Chrome, Safari og på mobil, og derfor måtte jeg bruge ekstra tid på media queries og justeringer af størrelser og layout. Det gjorde, at jeg måtte re-estimere nogle af opgaverne undervejs.

Min WBS og MoSCoW-prioritering hjalp mig med at fokusere på de vigtigste krav først. Da tiden blev mere presset, valgte jeg derfor at prioritere HTML, CSS, responsivt design og indhold frem for ekstra CSS-effekter og flere HTML-sider.

Hvis jeg skulle lave projektet igen, ville jeg teste hjemmesiden på mobil og forskellige browsere tidligere i processen. Jeg ville også lave en mere realistisk tidsestimering af CSS-delen, da den tog væsentligt længere tid, end jeg havde forventet. Jeg endte også med at bruge unødvendig meget tid på at ændre mit design undervejs, da jeg ikke havde fastlagt det inden, så det vil jeg også ændre til næste gang.
